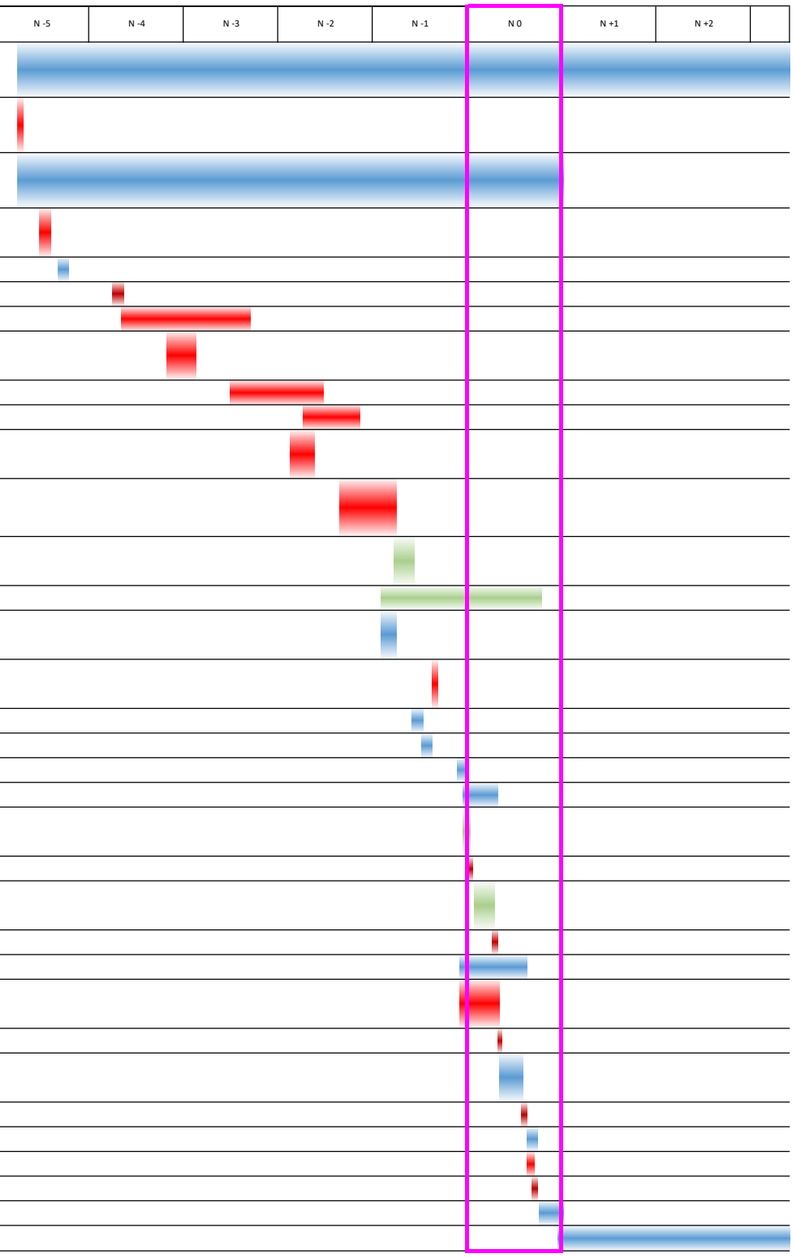p.č.	Název hlavní činnosti	Název vedlejší činnosti	schvaluje	odpovídá	poznámka	zahájení	konec	typ	roky / týdny
1	Projekt pořízení nového vojenského materiálu (VM)		MO ČR	N SOPS	15.06.2015 N-5 let	-247	156	P1	403
1.1		Dlouhodobí výhled pro obranu 2030	MO ČR	N SOPS	15.06.2015	-247	-245	D	2
		Příprava projektu (od prvotní myšlenky po dodání prvního kusu)				-247	52	P1	299
2	Charakteristika požadavku na pořízení nového VM		Ř SRS MO	SRS MO		-235	-230	D	5
3	Zařazení do SdP 2018-2022		N GŠ AČR	Ř SPS MO		-225	-220	P1	5
4	Schválení SdP 2018-2022		MO ČR	SOPS MO		-195	-190	U	5
5	Specifikace a zpracování TTP		N GŠ AČR	SRS MO		-190	-120	D	70
6	Zařazení do akvizičního plánu 2018-2020		MO ČR	SRS MO		-165	-150	D	15
6.1		Potvrzení a upřesnění v SdP 2021-2025	MO ČR	SOPS MO	05.06.2018	-130	-80	D	50
7	Zpracování harmonogramu projektu		MO ČR	SVA MO		-90	-60	D	30
8	Zařazení do akvizičního plánu 2019-2021		MO ČR	SVA MO		-97	-85	D	12
8.1		Potvrzení a upřesnění v SdP 2022-2026	MO ČR	SOPS MO		-70	-40	D	30
9	Vyhlášení soutěže (dle schválené varianty řešení)	příprava kolegia a mat. pro jednájní vlády	Kolegium, vláda	SVA MO		-40	-30	O	10
10	Realizační fáze projektu					-47	40	O	0
		vyhlášení soutěže a předání zadávací dokumentace	SVA MO	manažer projektu		-47	-40	P1	7
		zařazení vojskových zkoušek do plánu činnosti rezortu MO na následující rok	N GŠ AČR	SRS MO		-19	-17	D	2
		vyhodnocení nabídek	SVA MO	manažer projektu		-30	-25	P1	5
		podpis smlouvy	SVA MO	manažer projektu		-25	-20	P1	5
		podnikové zkoušky	SVA MO	manažer projektu		-5	0	P1	5
		kontrolní zkoušky	SVA MO	manažer projektu		-2	16	P1	0
		- příprava harmonogramu a nařízení zkoušek	SVA MO	manažer projektu		-2	1	O	3
		- schválení Nařízení zkoušek	SVA MO	manažer projektu		1	2	U	1
		- provedení zkoušek a vypracování zprávy	SVA MO	manažer projektu		4	14	O	10
		- schválení zprávy ze zkoušek	SVA MO	manažer projektu		14	16	U	2
		Vojskové zkoušky	N GŠ AČR	SRS MO		-4	32	P1	0
		- příprava harmonogramu a nařízení zkoušek	Ř SRS MO	SRS MO		-4	17	D	21
		- schválení Nařízení zkoušek	N GŠ AČR	SRS MO		17	18	U	1
		- provedení zkoušek a vypracování zprávy	Ř SRS MO	SRS MO		18	30	P1	12
		- schválení zprávy ze zkoušek	N GŠ AČR	SRS MO		30	32	U	2
		Zavedení VM do užívání v rezortu				33	38	P1	5
		- zpracování návrhu na zavedení		manažer projektu		33	36	D	3
		- schválení zavedení	N GŠ AČR	manažer projektu	cestou SRS MO	36	38	U	2
		Dodávka prvního kusu	zástupce uživatele	dodavatel	N (rok 2020)	40	52	P1	12
		realizace dodávky zbývajicích kusů	zástupce uživatele	dodavatel	N + 5	50	156	P1	106
